
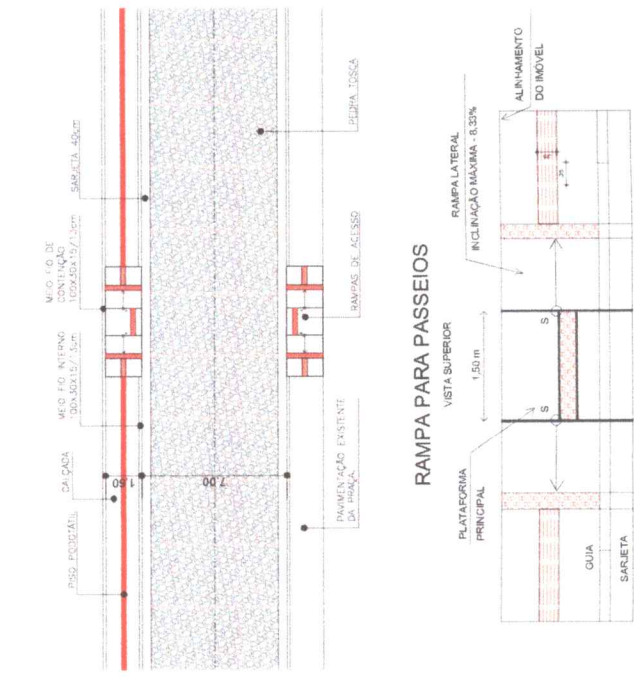

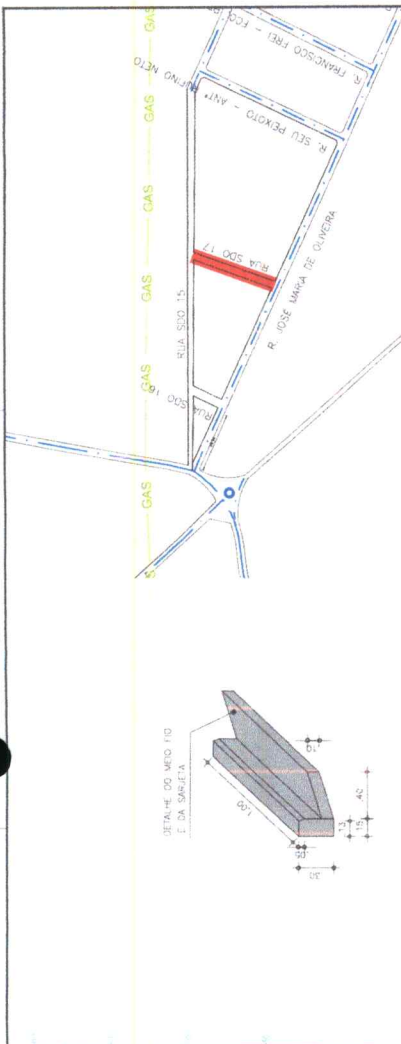
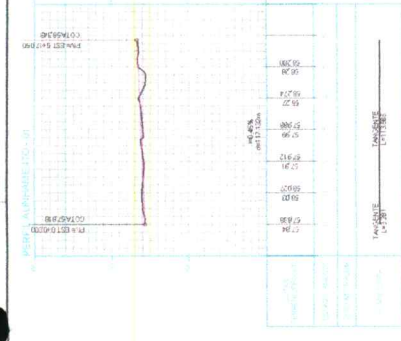


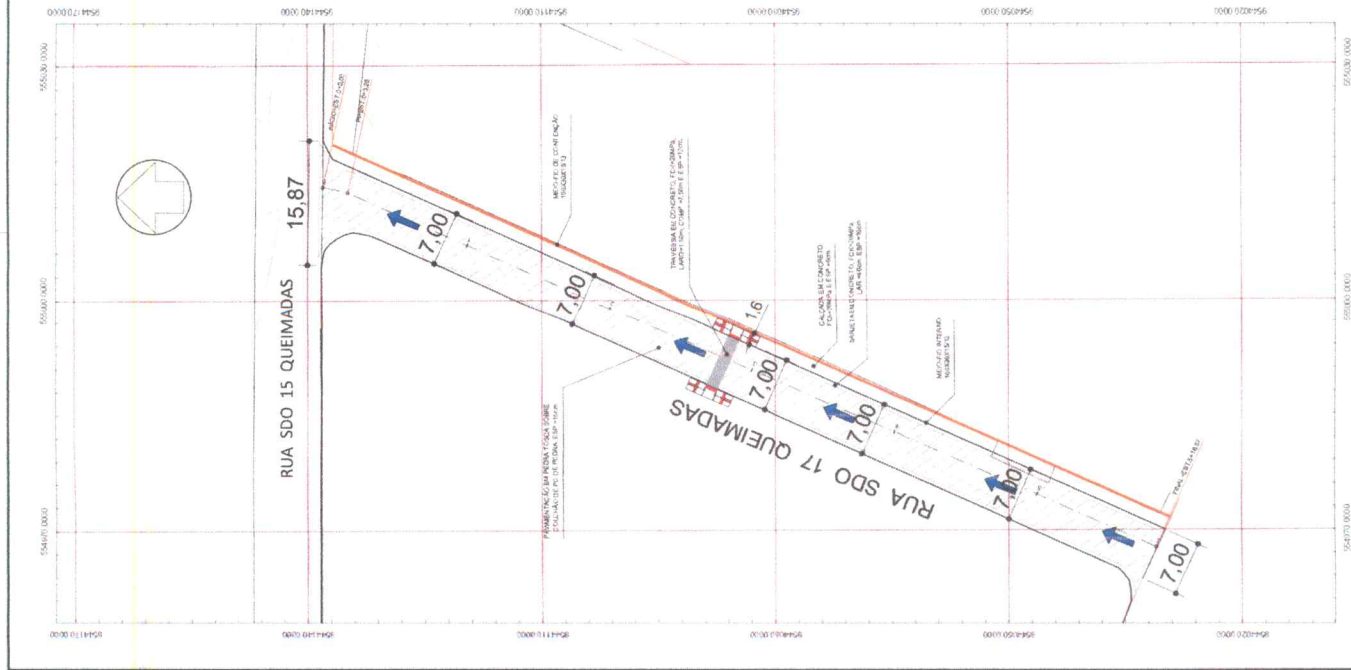

01 - ELEVADO

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50



1:50

1:50

1:50




- | | | | |
|-------|--|------|------------------------|
| R-1 | Placa obrigatória | A-16 | Sinalização ou lombada |
| R-3 | Sentido proibido | A-45 | Rua sem saída |
| R-4b | Proibido virar à direita | A-46 | Placa em barrete |
| R-10 | Proibido virar à esquerda | A-47 | Placa em poste |
| R-11 | Proibido transitar de veículos automotores | A-48 | Indicação de lombada |
| R-25a | Vira à esquerda | A-49 | Tachômetro |
| R-25b | Vira à direita | | |

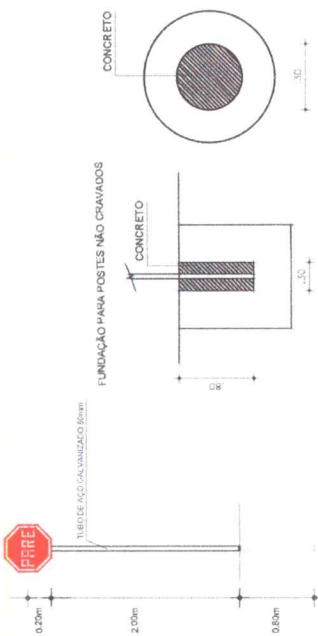


[Signature]

[illegible]

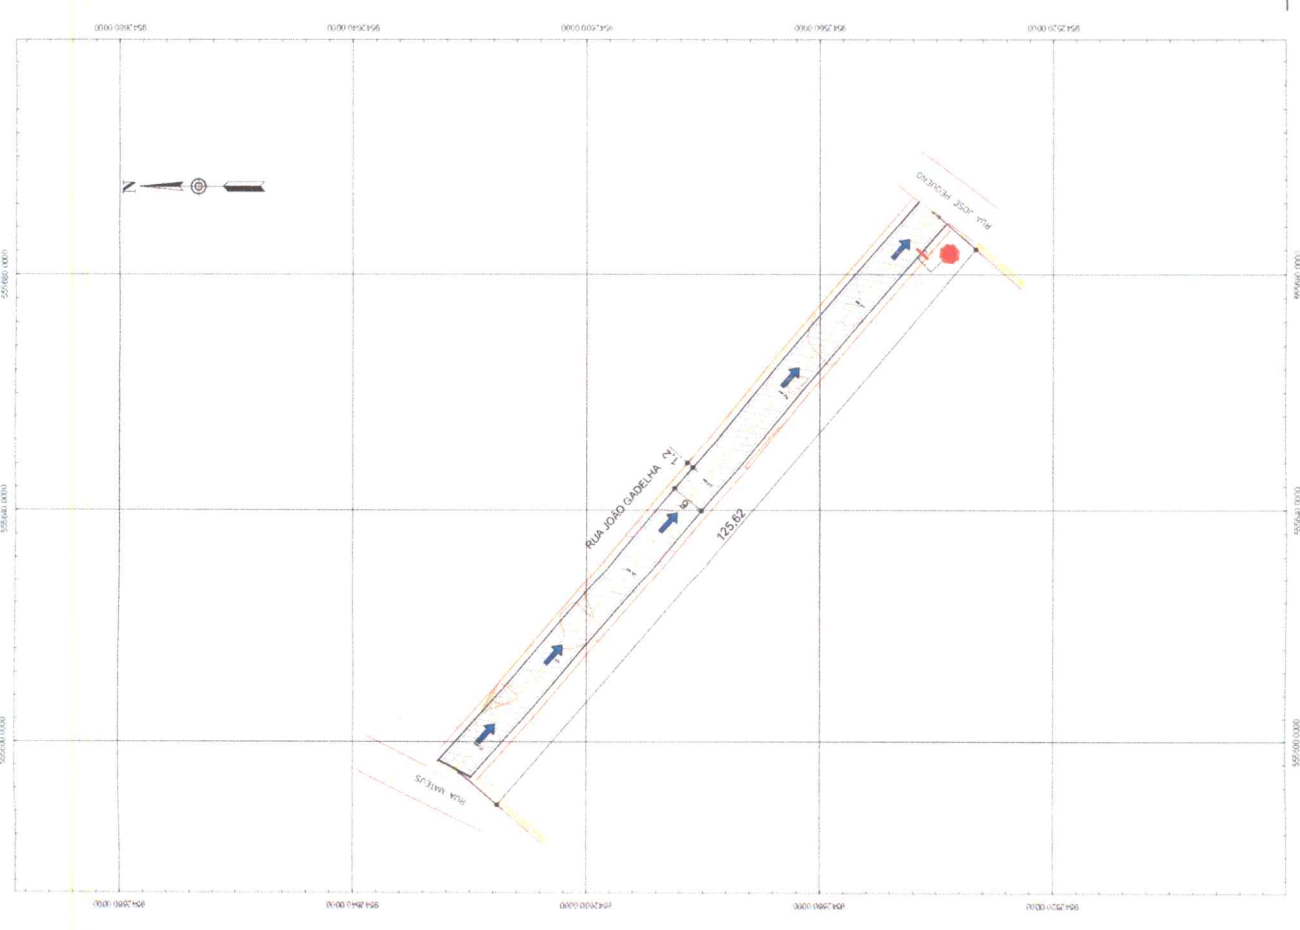

LEGENDA

- R-1 Placa obrigatória
- R-3 Sinal proibido
- R-4b Proibido virar à direita
- R-10 Proibido trânsito de veículos autotransportadores
- R-25a Virar à esquerda
- R-25b Virar à direita
- A-18 Sinalização ou lombada
- A-45 Rua sem saída
- Placa em bancada
- Placa em poste
- Indicação de lombada
- Tachetas

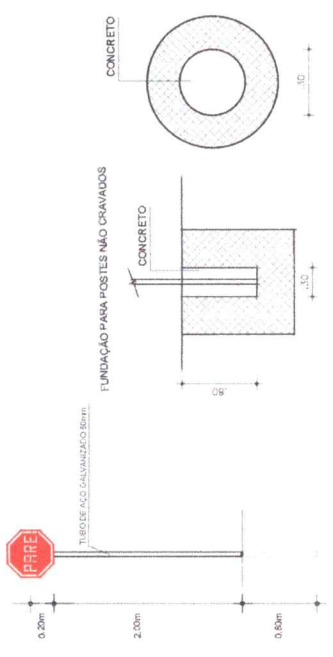

QUANTIDADE		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	DA	DB	DC	DD	DE	DF	DG	DH	DI	DJ	DK	DL	DM	DN	DO	DP	DQ	DR	DS	DT	DU	DV	DW	DX	DY	DZ	EA	EB	EC	ED	EE	EF	EG	EH	EI	EJ	EK	EL	EM	EN	EO	EP	EQ	ER	ES	ET	EU	EV	EW	EX	EY	EZ	FA	FB	FC	FD	FE	FF	FG	FH	FI	FJ	FK	FL	FM	FN	FO	FP	FQ	FR	FS	FT	FU	FV	FW	FX	FY	FZ	GA	GB	GC	GD	GE	GF	GG	GH	GI	GJ	GK	GL	GM	GN	GO	GP	GQ	GR	GS	GT	GU	GV	GW	GX	GY	GZ	HA	HB	HC	HD	HE	HF	HG	HH	HI	HJ	HK	HL	HM	HN	HO	HP	HQ	HR	HS	HT	HU	HV	HW	HX	HY	HZ	IA	IB	IC	ID	IE	IF	IG	IH	II	IJ	IK	IL	IM	IN	IO	IP	IQ	IR	IS	IT	IU	IV	IW	IX	IY	IZ	JA	JB	JC	JD	JE	JF	JG	JH	JI	JJ	JK	JL	JM	JN	JO	JP	JQ	JR	JS	JT	JU	JV	JW	JX	JY	JZ	KA	KB	KC	KD	KE	KF	KG	KH	KI	KJ	KK	KL	KM	KN	KO	KP	KQ	KR	KS	KT	KU	KV	KW	KX	KY	KZ	LA	LB	LC	LD	LE	LF	LG	LH	LI	LJ	LK	LM	LN	LO	LP	LQ	LR	LS	LT	LU	LV	LW	LX	LY	LZ	MA	MB	MC	MD	ME	MF	MG	MH	MI	MJ	MK	ML	MM	MN	MO	MP	MQ	MR	MS	MT	MU	MV	MW	MX	MY	MZ	NA	NB	NC	ND	NE	NF	NG	NH	NI	NJ	NK	NL	NM	NN	NO	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	NW	NX	NY	NZ	OA	OB	OC	OD	OE	OF	OG	OH	OI	OJ	OK	OL	OM	ON	OO	OP	OQ	OR	OS	OT	OU	OV	OW	OX	OY	OZ	PA	PB	PC	PD	PE	PF	PG	PH	PI	PJ	PK	PL	PM	PN	PO	PP	PQ	PR	PS	PT	PU	PV	PW	PX	PY	PZ	QA	QB	QC	QD	QE	QF	QG	QH	QI	QJ	QK	QL	QM	QN	QO	QP	QQ	QR	QS	QT	QU	QV	QW	QX	QY	QZ	RA	RB	RC	RD	RE	RF	RG	RH	RI	RJ	RK	RL	RM	RN	RO	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV	RW	RX	RY	RZ	SA	SB	SC	SD	SE	SF	SG	SH	SI	SJ	SK	SL	SM	SN	SO	SP	SQ	SR	SS	ST	SU	SV	SW	SX	SY	SZ	TA	TB	TC	TD	TE	TF	TG	TH	TI	TJ	TK	TL	TM	TN	TO	TP	TQ	TR	TS	TT	TU	TV	TW	TX	TY	TZ	UA	UB	UC	UD	UE	UF	UG	UH	UI	UJ	UK	UL	UM	UN	UO	UP	UQ	UR	US	UT	UU	UV	UW	UX	UY	UZ	VA	VB	VC	VD	VE	VF	VG	VH	VI	VJ	VK	VL	VM	VN	VO	VP	VQ	VR	VS	VT	VU	VV	VW	VX	VY	VZ	WA	WB	WC	WD	WE	WF	WG	WH	WI	WJ	WK	WL	WM	WN	WO	WP	WQ	WR	WS	WT	WU	WV	WW	WX	WY	WZ	XA	XB	XC	XD	XE	XF	YG	YH	YI	YJ	YK	YL	YM	YN	YO	YP	YQ	YR	YS	YT	YU	YV	YW	YX	YY	YZ	ZA	ZB	ZC	ZD	ZE	ZF	ZG	ZH	ZI	ZJ	ZK	ZL	ZM	ZN	ZO	ZP	ZQ	ZR	ZS	ZT	ZU	ZV	ZW	ZX	ZY	ZZ
------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Eng. João Gabriel

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

Projeto de Sinalização






Fls. 01



Projeto de Sinalização

Fls. 01

Projeto de Sinalização

Fls. 01

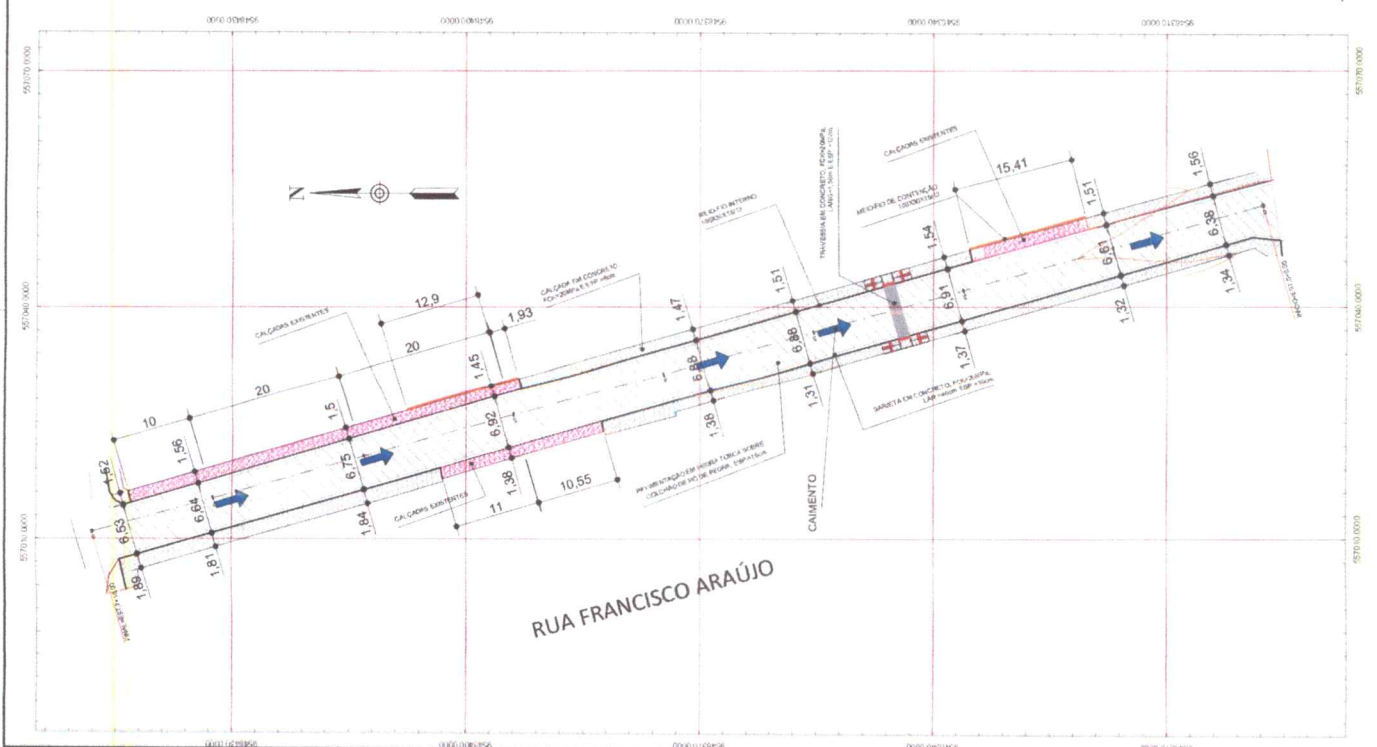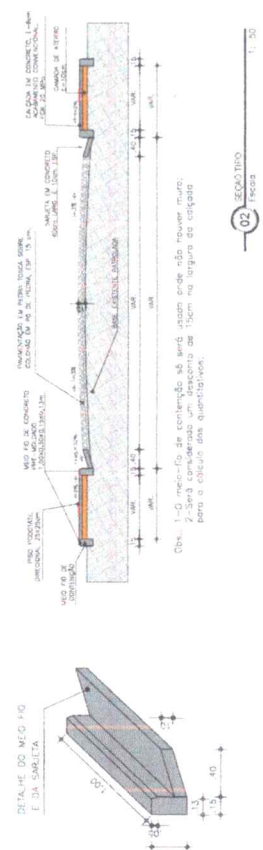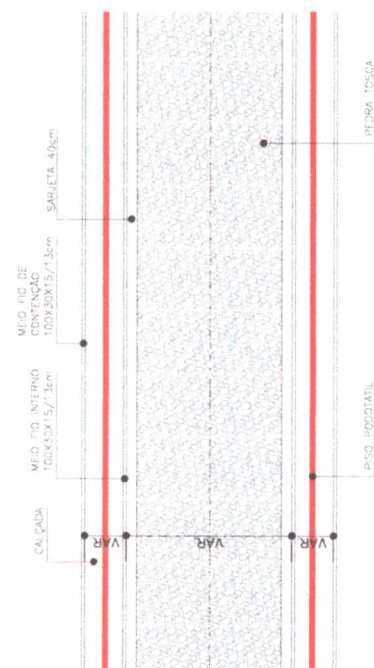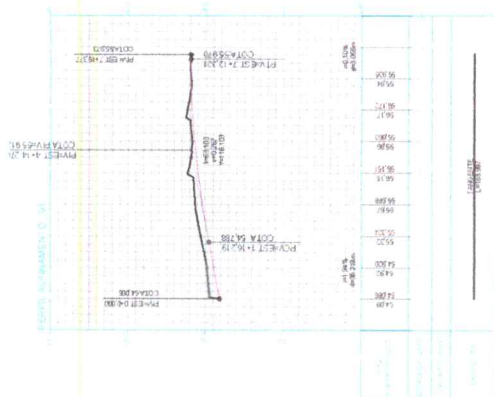

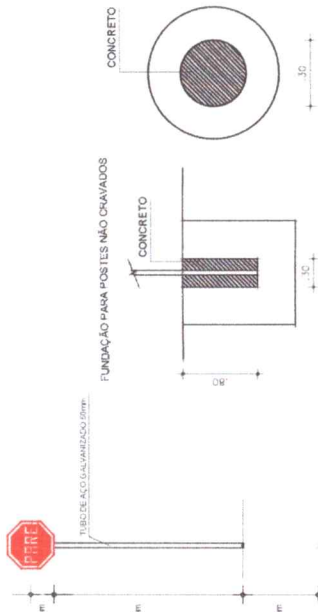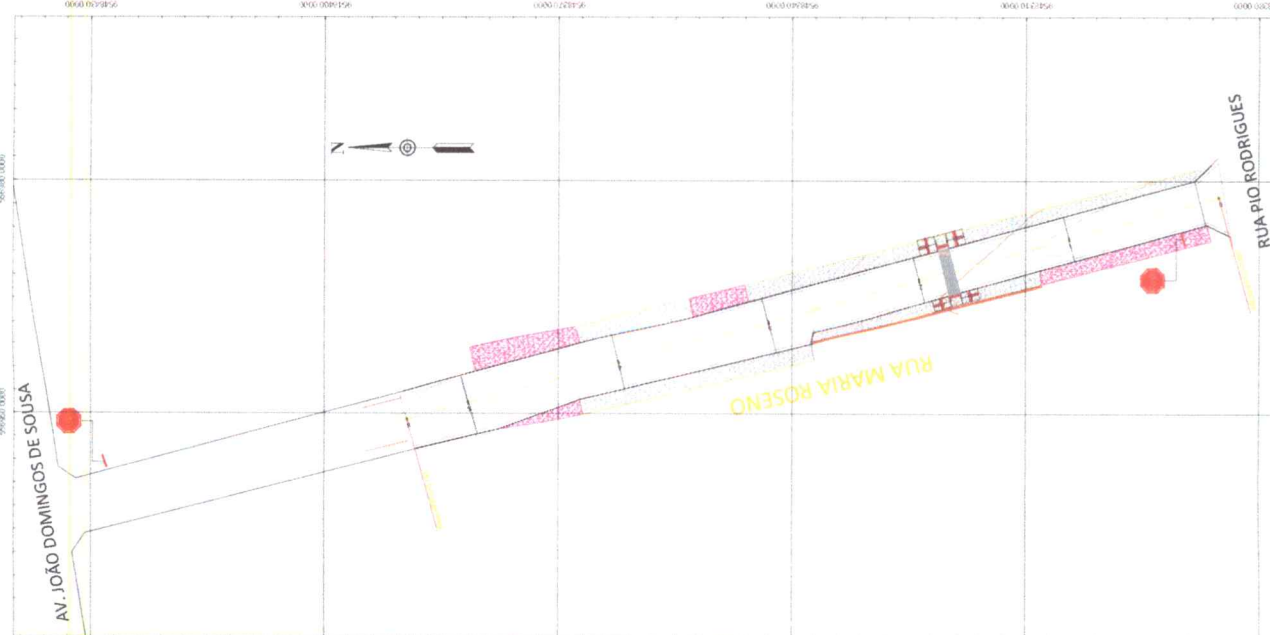

LEGENDA

- | | | | | | |
|-------|---|------|------------------------|-------|-------|
| R-1 | Pende obrigatória | A-18 | Sinalização ou lombada | Ta-08 | Ta-09 |
| R-3 | Sentido proibido | A-45 | Rua sem saída | Ta-10 | Ta-11 |
| R-4b | Proibido virar à direita | A-46 | Placa em barragem | Ta-12 | Ta-13 |
| R-10 | Proibido trânsito de veículos automotores | A-47 | Placa em ponte | Ta-14 | Ta-15 |
| R-25a | Via à esquerda | A-48 | Indicação de lombada | Ta-16 | Ta-17 |
| R-25b | Via à direita | A-49 | Indicação de lombada | Ta-18 | Ta-19 |

[illegible]



RELATÓRIO DE ALTERAÇÃO DO PROJETO

Trata-se da obra de PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, com recursos federais, através do MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL.

PT Nº: 1074188-20 / **CONVÊNIO:** 908250

VALOR DE REPASSE: R\$ 2.996.647,00

A obra em questão já teve o LAE emitido, a licitação realizada através da tomada de preços nº 2021.07.23.1 e contratada por meio do contrato nº 2021.11.17.1, firmado entre o MUNICÍPIO DE HORIZONTE e a empresa SOUSA & LIMA CONSTRUÇÕES EIRELI, no valor de R\$ 2.236.709,04 e vigência até 17/11/2022. A obra foi iniciada em 01/02/2022 e o valor executado acumulado foi de R\$ 233.976,04. Os serviços executados são referentes às ruas Francisco Geraldo (rua 9) e Manuel Manduca (rua 21). A Rua Francisco Geraldo foi concluída a pavimentação da rua e da calçada, já a rua Manoel Manduca a pavimentação da rua foi quase concluída (97,51%) e a pavimentação da calçada não foi iniciada. O contrato em questão foi rescindido e o remanescente da obra foi relicitado.

A nova licitação foi realizada através da concorrência pública nº 2022.11.29.1 e contratada por meio do contrato nº 2023.04.05.2, firmado entre o MUNICÍPIO DE HORIZONTE e a empresa CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA, no valor de R\$ 2.734.839,39 e vigência até 05/04/2024. A obra foi iniciada em 05/06/2023 e o valor executado acumulado foi de R\$ 506.541,63. Os serviços executados são referentes às ruas Adauto Farias (rua 1), Juvenal Simião (rua 2), São Francisco (rua 3), SDO – Rua do PSF (rua 5), Raimundo Leandro de Lima (rua 10) e SDO (rua 14). Todas as ruas citadas anteriormente (para o CT 2023.04.05.2) foram concluídas a pavimentação em pedra tosca.

O contrato em questão (2023.04.05.2) Foi Encerrado e o remanescente da obra será relicitado. Para isso, faz-se necessário a atualização dos preços dos serviços que compõem o orçamento da obra. As quantidades incluídas no orçamento foram referentes ao saldo do contrato supracitado.



Os projetos não sofreram alterações (podem ser consideradas as mesmas inseridas na P+B).

As alterações realizadas no orçamento serão listadas a seguir e detalhadas em anexo:

- Por se tratar de um orçamento do remanescente de uma obra, foi adotada a premissa de manter a estrutura analítica do orçamento, assim como os serviços, sendo somente atualizado o preço dos insumos. Nos casos onde os insumos não existem mais na tabela atual, foi substituído por insumos correlatos;
- Foi atualizado a data base do orçamento para abril de 2024, sendo utilizado a tabela seinfra 28 e a tabela SINAPI CE de abril de 2024;
- Foi observado que o orçamento não desonerado é mais vantajoso para a Administração Pública, logo o BDI e os Encargos Sociais foram compatibilizados com tal escolha.
- Quanto às quantidades: para as ruas executadas descritas anteriormente (ruas 1, 2, 3, 5, 10 e 14) as quantidades foram zeradas somente referente aos serviços de pavimentação em pedra tosca, visto que foram completamente executada no contrato nº 2023.04.05.2, logo referente aos serviços de pavimentação das calçadas, como não foi executado nenhum serviço, foi considerado o saldo dos serviços em sua totalidade.

Diante disso, o município de horizonte solicita uma análise das respectivas alterações realizadas no orçamento, para após isso ser realizado um novo processo licitatório e a obra ser executada.

Miguel Cristiano Alves de Brito
engenheiro civil

Ricardo Dantas Sampaio
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO,
AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS.



**PREFEITURA DE
HORIZONTE**
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ.

PROTOCOLO
UNID. CONVÊNIOS - P



UNID. CONV. **Ofício.nº: 075/2021**

Horizonte-CE, 13 de Julho de 2021.

Ao Senhor
Carlos Eloy Cavalcante Lima
Presidente da Câmara Municipal de Horizonte
Horizonte-CE

MUNICIPAL DE HORIZONTE
RECEBID
16/07/2021
CARLOS ELOY CAVALCANTE LIMA

ASSUNTO: Plano de Sustentabilidade do **PT 1074188-20**

Senhor Presidente,

A Prefeitura Municipal de Horizonte, inscrita no CNPJ: 23.555196.0001-86, representado pelo Sr. Manoel Gomes de Farias Neto, inscrito(a) no C.P.F sob o nº 15404226315, vem encaminhar para conhecimento a V.Exª o Plano de Sustentabilidade do **PT 1074188-20** com a Caixa Econômica Federal, conforme nos foi solicitado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional.

Atenciosamente,



MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
PREFEITO DE HORIZONTE

Avenida Presidente Castelo Branco, 5100, Centro, CEP - 62880-060
CNPJ: 23.555.196/0001-86 ☎ (85) 3336-6000 | (85) 3336-6001

📱 Prefeitura de Horizonte 🌐 Prefeitura horizonte 🌐 www.horizonte.ce.gov.br
